京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(主体工事)(再)　令和6年 10月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
【Ⅰ期棟】																														
(西駐車場跡付近)																							石垣擁壁復旧						
1工区	1G配筋		1S配筋				配筋検査																					北側外部ｱｽﾌｧﾙﾄ防水		
								C打設(B1F躯体)						養生期間				脱型					外部防水下地					南側塗膜防水	
								返し型枠			打継処理													鉄骨階段設置				足場組	
		梁落とし									墨出				1C配筋						1W配筋		階段足場解体					ﾓﾙﾀﾙ詰め		
															X1通足場組		配筋検査				1階型枠建込み・2Sスラブ型枠									
																	UT													
2工区	1G配筋							1S配筋																						
	UT								配筋検査					C打設(B1F躯体)				養生期間					脱型		外部防水下地					北側外部ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
										返し型枠					打継処理															南側塗膜防水
																墨出		1C配筋					1W配筋							
							梁落とし														配筋検査		1階型枠建込み・2Sスラブ型枠								
																					UT									
			鉄搬入																											
3工区		ｲﾝｻｰﾄ		1G配筋				1S配筋							配筋検査															
	1Sスラブ型枠			1G溶接												返し型枠	C打設(B1F躯体)			養生期間				脱型					外部防水下地	
							UT																							
																		墨出				1C配筋		1W配筋						
																						配筋検査		1階型枠建込み・2Sスラブ型枠						
																						UT								
工事車両	4～10t車10台/日程度						4～10t車10台/日程度				4～10t車10台/日程度						4～10t車10台/日程度					4～10t車10台/日程度						4～10t車10台/日程度		
作業音(第Ⅰ期棟)	中	中	中	中			中	中	中	大	中				大	中	大	中			中	中	中	中	中			中	中	中
															4～10t車50台/日程度															

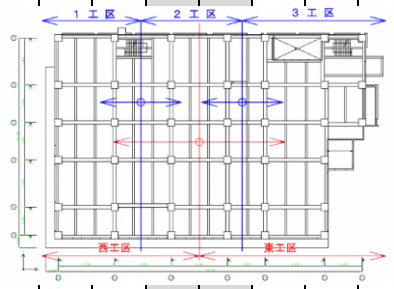

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。
